

Nieuwsbrief 02

Renovatie Petrakerk 2.1



Beste gemeenteleden,

Beste gemeenteleden,

Met deze digitale nieuwsbrief willen we u graag op hoogte houden van de renovatie werkzaamheden. Wat gebeurt er zoal in het kerkgebouw? We doen dat digitaal met enkele foto's en achtergrondinformatie. Op de website worden meer beelden gedeeld. Op deze manier kunt u de vorderingen van de renovatie volgen.

In deze nieuwsbrief leest u over de eerste werkzaamheden van de aannemer, en doorkijk naar komende werkzaamheden en de keuze voor de namen van de zalen.

Voortgang

De aannemer is voortvarend gestart met het grove sloopwerk, maar gelukkig wordt er ook weer opgebouwd! De heipalen voor de fundering zijn geslagen, de vloer van de uitbouw is gelegd en de binnenmuren van het nieuwe trappenhuis worden al opgebouwd. Het oude trapgat in de verdiepingsvloer is dichtgemaakt en de hele 1e verdieping is nu bijna 1 grote ruimte.

Ook de klimaatinstallatie is verplaatst en dat is maar goed ook omdat de eerste verdieping nu aan bijna alle zijden open is. Daar is het nu erg goed geventileerd. Zoals bekend is de planning dat het gebouw voor de vakantie waterdicht zal zijn. Het dak moet waterdicht zijn voordat wordt gestart

met de montage van de klimaatinstallatie. Oorspronkelijk zou dus de klimaatinstallatie in werking worden gesteld in de maand september. Mede door het warme weer is eerder in werking brengen van de koeling zeer gewenst. In overleg met Klimateerservice is een oplossing gevonden eerder te starten met de montage. Klimateerservice zal de klimaatinstallatie voor de komende vakantie werkend opleveren (week 29).

Op de begane grond begint ondertussen de indeling al enige vorm te krijgen. Door de plaatsing van de wanden wordt al herkenbaar wat op tekening is gezet. Onderstaande in grove opzet de planning van de diverse werkzaamheden.

Samen met de aannemer en de schoonmaakploeg werken de kosters er aan om de kerk op zondag te kunnen gebruiken. Mocht u iets opmerken of een tip hebben dan horen wij dat graag via mail pgz@gergemhia.nl of één van de leden van de projectgroep. We proberen zo alles zo goed als mogelijk haar voortgang te laten hebben.


Financiën

Het is duidelijk dat er echt gewerkt wordt. De nodige facturen komen namelijk binnen. Elke vergadering van de projectgroep houden we een financiële update met hoe we erbij staan ten opzichte van de raming en wat kunnen we nog verwachten. Er zijn tegenvallers én meevallers, maar op dit moment zitten we nog op koers binnen de budgetten.

Namen zalen

Met enthousiasme is er gereageerd op de oproep om namen in te dienen voor de verschillende zalen in de kerk. Er waren 9 voorstellen waaruit gekozen kon worden. De voorstellen A. - 'Plaatsen' in de Bijbel en B. - Bergen hadden een duidelijke voorkeur van de meeste stemmers. Vanwege de symboliek met de naam van onze kerk heeft de kerkenraad en projectgroep gekozen om het voorstel met de bergen over te nemen.

1. Hermon (2814m)
2. Horeb (2285m)
3. Gerizim (881m)
4. Moria (765m)
5. Tabor (575m)
6. Karmel (546m)






Bij de uitwerking van het interieur wordt nu nagedacht hoe we op een creatieve manier per zaal iets van de betreffende berg en informatie uit de bijbel kunnen verbeelden.


Fietsparkeren

Met het mooie weer komen veel gemeentelieden op de fiets naar de kerk. In allerlei opzicht erg positief; meer ontmoeting, het is gezond en goed voor het milieu. Afgelopen winter is een mooie fietsparkeerplaats gerealiseerd. Het gras tussen de stenen begint te groeien en de jeugd uit de buurt hebben we al zien voetballen. We zien dat het ook veiliger is met de nieuwe haag tussen de fietsparkeerplaats en de Graaf Willemlaan. Het was niet onze verwachting dat alle fietsen op deze parkeerplaats zouden passen.

We hebben met de gemeentebesturen gezocht naar een optimum. Het lijkt er echter wel op dat de fietsen met enige regulering meer optimaal geplaatst kunnen worden door netjes aan te sluiten en met een dubbele rij in het middenvak. Het is voor het overzicht het meest praktisch om te beginnen met stallen langs de haag aan de Graaf Willemlaan. Wilt u hier aandacht voor hebben?

De financiën zijn nodig om de renovatie te kunnen betalen maar dit getuigt ook van draagvlak en uw betrokkenheid bij het werk in de gemeente. Laten we bovenal aanhoudend bidden of de Heere dit werk ook voor ons allen mag zegenen zodat er groei mag zijn in de gemeente.

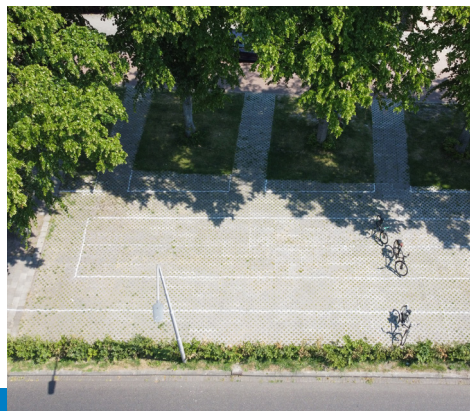

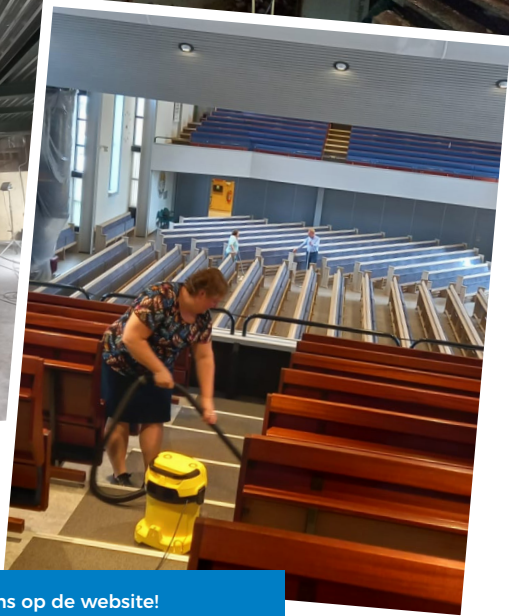

kijk eens op de website!
daar zijn nog meer foto's te vinden
<https://gergemhia.nl/nieuws/>

