

Nieuwsbrief 03

Renovatie Petrakerk 2.1



Beste gemeenteleden,


Met deze digitale nieuwsbrief houden we u graag op hoogte van de renovatiewerkzaamheden. Wat is er al gebeurd en wat is de planning na de bouwvak? U leest over de werkzaamheden van de aannemer, een doorkijk naar komende werkzaamheden, enkele uitwerkingen en de financiële stand van zaken.

We sturen u met enige regelmaat een link naar foto's en video's. U kunt zelf ook een kijkje nemen op het account op de site Flickr Renovatie GGHIA's albums | Flickr. We hopen dat u betrokken bent en uit ziet naar het toekomstig gebruik.

Voortgang

Voor de vakantie is op de eerste verdieping een nagenoeg nieuwe staalconstructie geïnstalleerd voor de nieuwe indeling en de zolderverdieping met dakkapel. Ook zijn alle vloeren voorzien van vloerverwarming en zijn de beton dekvloeren gestort. De uitbouw is gerealiseerd met de nieuwe trappartij. Het dak is waterdicht en de gevels voor het grootste deel. Op de begane grond zijn bijna alle wanden en kozijnen geplaatst. We zijn ook erg blij dat de klimaatinstallatie weer in werking is en de kerkzaal gekoeld kan worden.

Tijdens de vakantieperiode is door de metselaars doorgewerkt. Daarnaast konden de betonvloeren goed uitharden. Na de

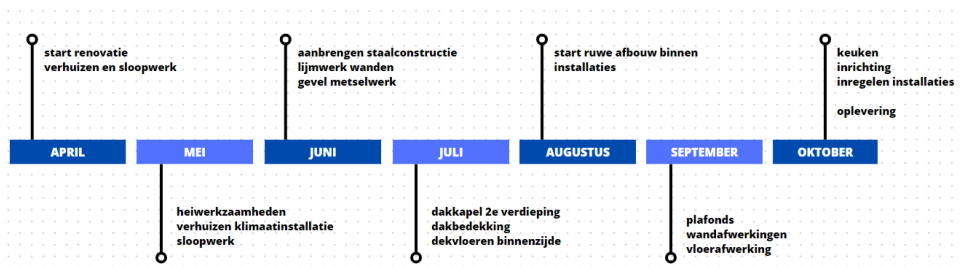

vakanties wordt gestart met het plaatsen van de dakkapel op de zolder en de afbouw met de binnenwanden op de verdieping en de zolder. Op de begane grond gaat de stukadoor aan de slag.

Stap voor stap krijgen de plannen in de praktijk meer vorm. Wij zijn blij hoe het werk tot op heden mag verlopen.

Samen met de aannemer en de schoonmaakploeg zorgen de kosters ervoor dat we iedere zondag de kerk weer kunnen gebruiken. Mocht u iets opmerken of een tip hebben dan horen wij dat graag via mail pgz@gergemhia.nl of één van de leden

van de projectgroep. We proberen alles zo goed als mogelijk haar voortgang te laten hebben.

Financiën

De (verwachte) totale uitgaven van de renovatie inclusief wat extra werkzaamheden passen nog steeds binnen het mandaat van € 2.500.000. Tegelijkertijd constateren dat we er steeds dichterbij in de buurt komen. Zoals beloofd houden we u ook op de hoogte van de inkomsten. Onderstaand de tabel van het 1e halfjaar 2023 ten opzichte van het 1e halfjaar 2022 en 2021.

	1e hj 2023	2e hj 2022	2e hj 2021
Collecten/giften kerk	108.857	107.676	98.498
Collecten/giften renovatiekas	129.297	93.415	90.654
Overige inkomsten	69.941*	46.139*	39.382*
Totaal	308.095	247.230	228.534
 *inclusief Actiemarkt	 25.616	 25.996	
 *Inclusief nalatenschappen	 25.910		 20.000



We zijn dankbaar voor de stijging van de inkomsten. Zoals eerder aangegeven is voor het nakomen van de extra financieringslasten van de renovatie (rente en aflossingen) € 60.000 extra per jaar benodigd aan collecten/giften kerk en renovatiekas. In het eerste halfjaar 2023 zitten we al op een stijging van € 37.063. De afbeelding van de thermometer geeft aan waar we staan ten opzichte van het doel.

Mogen we ook het 2e halfjaar rekenen op uw milddadigheid naar draagkracht. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL97 RABO 0132 7635 67 ten name van Gerefor-

meerde Gemeente Hendrik Ido Ambacht. Met nevenstaande QR code kunt u eveneens éénmalig een bijdrage overmaken voor de renovatiekas.




Vrijwilligers

Zo nu en dan zijn er werkzaamheden die goed uitgevoerd kunnen worden door

Overzicht extra inkomsten 2023

Bijgewerkt tot en met kwartaal 2



vrijwilligers zonder technische kennis of uitgebreide ervaring. Zo zijn er enkele wanden gesausd, is de vloerverwarming afgewerkt en wordt de staalconstructie voorzien van brandwerende verf. Dank! Wij zijn blij met elke hulp! Deze inzet bespaart ons ook de nodige arbeidskosten van de aannemer.

Graag roepen we u op om u aan te melden voor de vrijwilligerspool. Als u zich per mail aanmeldt op renovatie@gergemhia.nl met uw telefoonnummer maakt u het ons gemakkelijk om hulpvragen concreet uit te zetten. Vele handen maken licht werk! In een later stadium zijn er lichte werkzaamheden mogelijk voor de verlichting en het inhuizen van de opgeslagen spullen en meubilair.



Plannen detailleren

Ook al zijn de aannemers met de uitvoering van de plannen bezig, toch wordt ook nog gewerkt aan de details. Zo zullen de entree-deuren aan de Thorbeckestraat naar voren worden geplaatst en gelijk komen met de gevel. Voor de regen is er immers een luifel bedacht en er ontstaat zo meer ruimte in de hal. Daarnaast is ook het plan opgevat om deze gevel te voorzien van ons kerkzegel met de naam van de kerk. Dit zegel wordt in een open/transparante uitvoering door Erik den Boer uitgewerkt in RVS.


Ook over de interieurinrichting wordt in details nagedacht en overlegd. Zo zijn kleuren en materialen voor de vloerbedekkingen, tegels op de begane grond, vloerbedekking op de trappen, garderobe en in de zalen op de verdiepingen gekozen. De creche en de zolder krijgen een gladde vloer. In kleurstelling is gezocht naar eenheid passend bij de grijze tegels. De wanden worden wit en accent tinten in zandkleur. Meubilair voor de zalen kunnen we grotendeels hergebruiken. De tafels worden voorzien van nieuwe

tafelbladen.

Voor de zolder wordt gezocht naar meer robuust meubilair met een eigen karakter. Hier wordt ook meer nadruk gelegd op een sfeervolle gezellige ruimte met warme houttinten en okergeel. Bij dit alles wordt meegedacht door diaken De Visser, Gerben Aman en Judith van Ruitenburg. We zijn hier blij mee!

Vooruitzicht

De vakanties zijn voor velen van ons weer voorbij. Het nieuwe schooljaar begint en daarmee straks ook het werk van catechisaties en verenigingen. Juist voor deze activiteiten als gemeente, rondom Gods Woord, is deze renovatie van betekenis. Er zijn ruimten beschikbaar en goede voorzieningen, waar jong en oud de mogelijkheid hebben om samen te komen. We hopen en bidden dat de catechisaties en het werk van de verenigingen gezegend mag worden. Dan is het renovatiewerk niet tevergeefs.

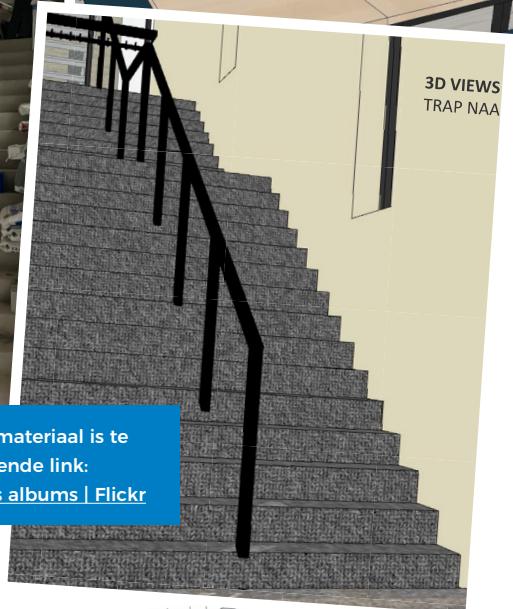

Het overige beeldmateriaal is te vinden op de volgende link:
[Renovatie GGHIA's albums | Flickr](#)

ENTREEGEVEL MET LOGO

